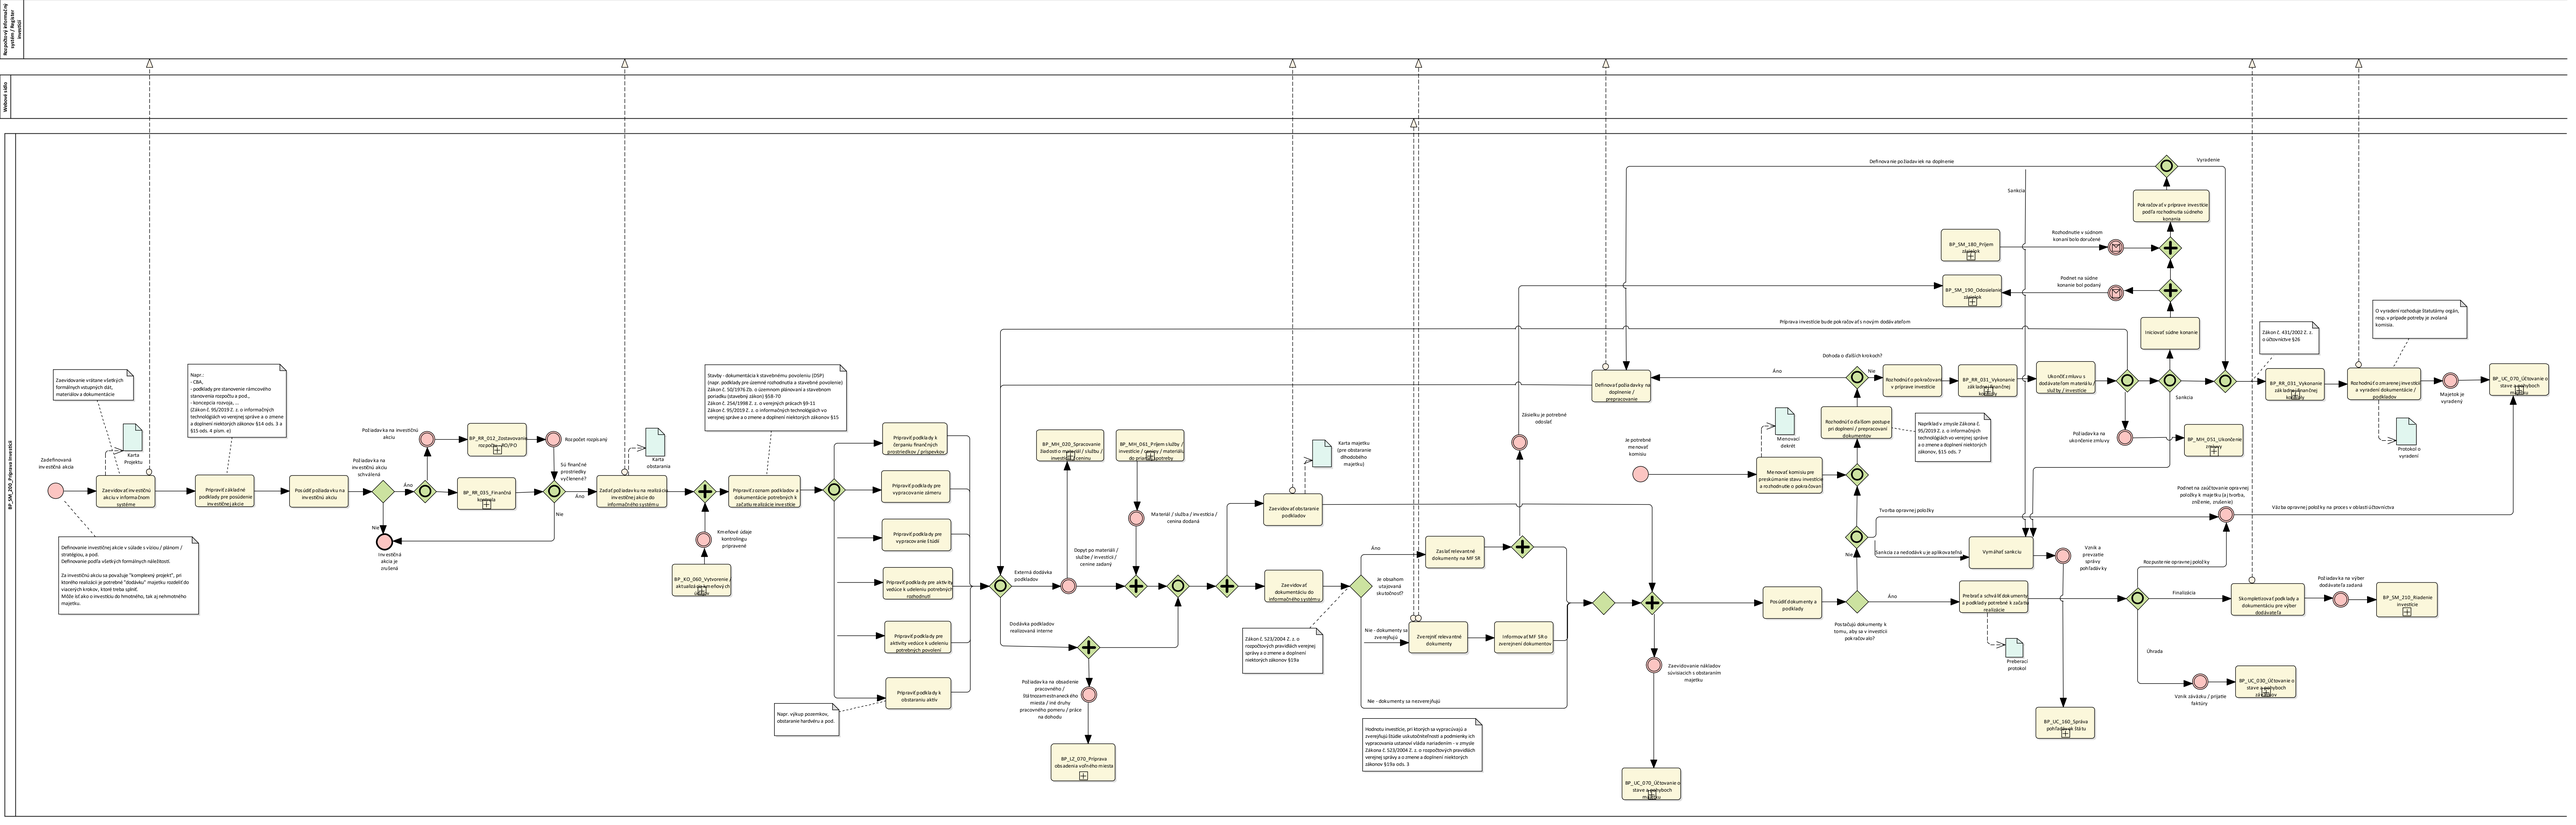
Rozpočtový informačný systém verejnej správy
Vedúci útvaru
BP_SM_050_Príprava investícií
Zadefinovaná investičná akcia
Zaevidovanie vstiahnutie všetkých formálnych vstupných dát, materiálov a dokumentácie
Karta Projektu
Definovanie investičnej akcie v súlade s víziou / plánom / stratégiou, a pod.
Definovanie podľa všetkých formálnych náležitostí.
Za investičnú akciu sa považuje "komplexný projekt", pri ktorého realizácii je potrebné "dodávku" majetku riadiť do viacerých krokov, ktoré treba splniť.
Môže ísť ako o investíciu do hmotného, tak aj nehmotného majetku.
Zaevidovanie vložené do systému
Zaevidovať investičnú akciu v informačnom systéme
Nepr.:
- CBA,
- podklady pre stanovenie rámcového stanovenia rozpočtu a pod.,
- koncepcia rizík, ...
(Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov §14 ods. 3 a §15 ods. 4 písm. e)
Pripraviť základné podklady pre posúdenie investičnej akcie
Posúdiť požiadavku na investičnú akciu
Požiadavka na investičnú akciu schválená
Áno
Nie
Investičná akcia je zrušená
Požiadavka na investičnú akciu
BP_RR_012_Zistovanie rozpočtu_RO/PO
BP_RR_035_Finančná kontrola
Rozpočet rozpracovaný
Sú finančné prostriedky vyčlenené?
Áno
Nie
Karta obstarania
Založ požiadavku na realizáciu investičnej akcie do informačného systému
Stavby - dokumentácia k stavebnému povoleniu (DSP)
(napr. podklady pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) §58-70
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach §9-11
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov §15
Pripraviť corpus podkladov a dokumentácie potrebných k začatiu re alizácie investície
Kmeňové údaje kontrolingu pripravené
BP_KO_060_Vytvorenie, aktualizácia prevádzkovej čl. oblasti
Pripraviť podklady k (ne)javnej finančnej prostriedky / príspevku
Pripraviť podklady pre vypracovanie zámeru
Pripraviť podklady pre vypracovanie ŠÚoSI
Pripraviť podklady pre aktivity vedúce k udeleniu potrebných rozhodnutí
Pripraviť podklady pre aktivity vedúce k udeleniu potrebných povolení
Pripraviť podklady k obstarániu aktív
Napr. výkup pozemkov, obstaranie hardvéru a pod.
BP_MH_020_Spracovanie žiadosti o materiál / službu / investičný zámer
BP_MH_041_Príjem služby / investície / zmeny / materiálu do prevádzky/sklad
Materiál / služba / investícia / cenina dodaná
Externá dodávka podkladov
Dopyt po materiáli / službe / investícii / cenine zadaný
Dodávka podkladov realizovaná interne
Požiadavka na obsadenie pracovného / štátnozamestnaneckého miesta / iné druhy pracovného pomeru / práce na dohodu
BP_LZ_070_Príprava obsadenia voľného miesta
Karta majetku (pre obstaranie dlhodobého majetku)
Zaeviduj obstaranie podkladov
Zaeviduj obstaranie dokumentácie do informačného systému
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov §19a
Je obsahom ustanovení skutočnosti?
Áno
Nie - dokumenty sa nezverejňujú
Nie - dokumenty sa zverejňujú
Zaslať relevantné dokumenty na MF SR
Zverejniť relevantné dokumenty
Informuj ať MF SR o zverejnení dokumentov
Hodnotu investície, pri ktorých sa vypracovajú a zverejňujú štúdie uskutočniteľnosti a podmienky ich vypracovania ustanoví vláda nariadením - v zmysle Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov §19a ods. 3
Zásielku je potrebné odoslať
Je potrebné menovať komisiu
Menovací dekret
Menovať komisiu pre preskúmanie stavu investície a rozhodnúť o pokračovaní
Definovať podľa dávky na doplnenie / prepracovanie
Dohoda o ďalších krokoch?
Áno
Nie
Rozhodnúť o pokračovaní v príprave investície
Rozhodnúť o ďalšom postupe pri doplnení / prepracovaní dokumentov
Napríklad v zmysle Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §15 ods. 7
BP_RR_031_Vykonanie zák.kontroly/auditu/ kontroly
Ukončiť zmluvu s dodávateľom materiálu / služby / investície
Požiadavka na ukončenie zmluvy
BP_MH_051_Ukončenie zmluvy
Sankcia
Definovaná nie požiadavka na doplnenie
Vyradenie
Sankcia
Pokračovať v príprave investície podľa rozhodnutia súdneho konania
Rozhodnutie v súdnom konaní bolo doručené
Podnet na súdne konanie bol podaný
BP_SM_180_Príjem dávok
BP_SM_190_Odoslanie dávok
Príprava investície bude pokračovať s novým dodávateľom
Iniciovať súdne konanie
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve §26
BP_RR_031_Vykonanie zák.kontroly/auditu/ kontroly
Rozhodnúť o zmarenej investícii a vyradení dokumentácie / podkladov
O vyradení rozhoduje štatutárny orgán, resp. v prípade potreby je zvolená komisia.
Majetok je vyradený
Protokol o vyradení
BP_UC_070_Účtovanie o stave a pohyboch majetku
Podnet na začatie opravnej položky k majetku (a) tvorba, zníženie, zrušenie)
Táto opravná položka na proces v oblasti účtovníctva
Tvorba opravnej položky
Sankcia za nedodávku v.pr.aplikovateľna
Nie
Áno
Vymáhať sankciu
Vznik a prevzatie správy pohľadávky
Posúdi dokumenty a podklady
Postačujú dokumenty k tomu, aby sa v investícii pok račova ať?
Prebrať a schváliť dokumenty a podklady potrebné k začatiu realizácie
Prebera ci protokol
Zaevidovanie nákladov súvisiacich s obstaraním majetku
Rozpustenie opravnej položky
Finalizácia
Úhrada
Vznik záväzku / prijatie faktúry
Skompletizovať podklady a dokumentáciu pre výber dodávateľa
Požiadavka na výber dodávateľa zadaná
BP_SM_210_Riadenie investície
BP_UC_030_Účtovanie o stave a pohyboch majetku
BP_UC_160_Správa pohľadávok štátu
BP_UC_070_Účtovanie o stave a pohyboch majetku
